

BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU


Kasım 2022



2022 Yılı BSM Memnuniyet Oranı



2022 Yılı Şeflik Bazlı Memnuniyet Oranı

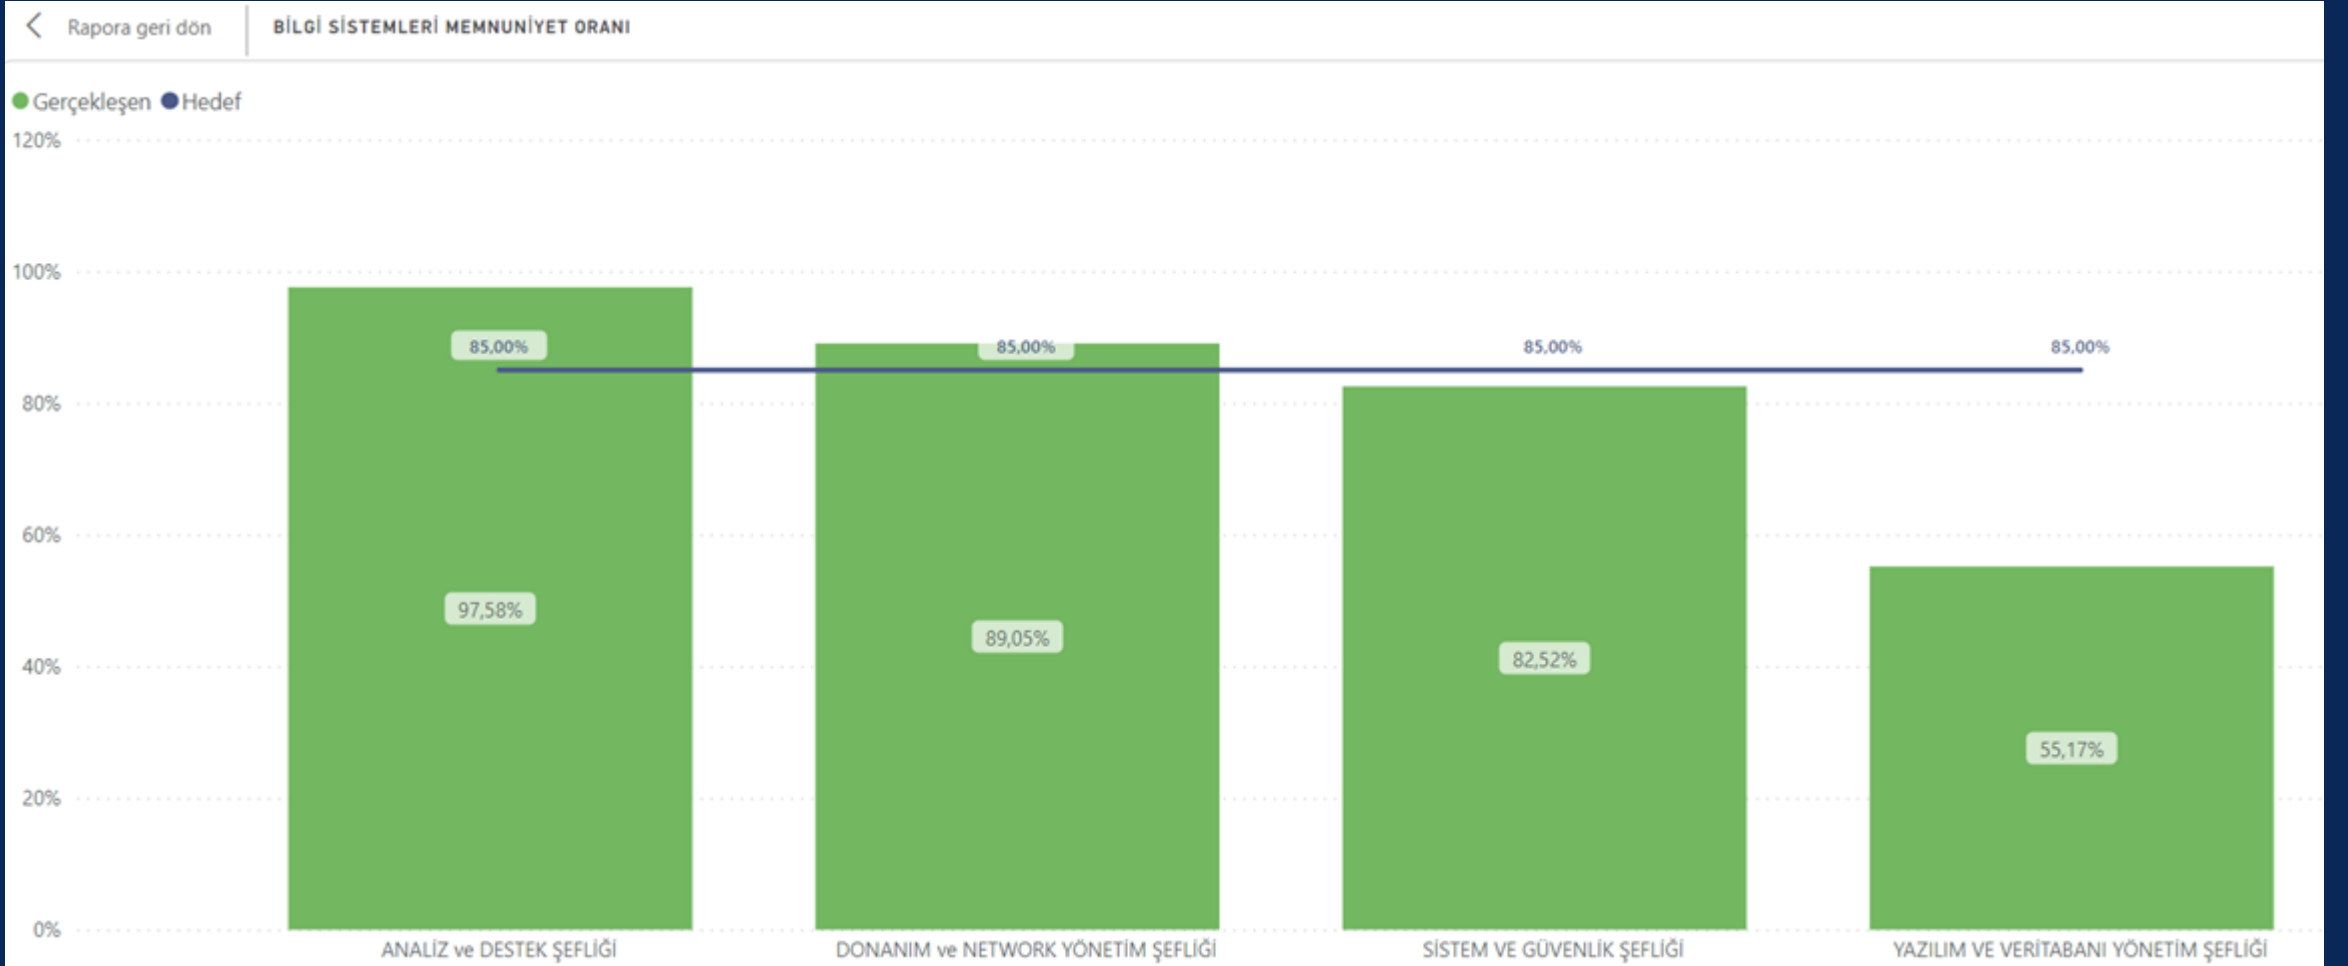


Kasım Ayı Şeflik Bazlı Memnuniyet Oranı




BSM Proje ve Faaliyet Durumu

Faaliyet/Proje	Proje Kodu	Metin	İş İlerleme Yüzdesi	Faaliyet/Proje Durumu	Tahmini Başl. Tarihi	Tahmini Bitiş Tarihi	Zamansal Yüzde İlerleme	Tahmini Bütçe	PB	Fiili Maaliyet	PB	Maliyet Yüzdesi
ISO 27001 FAZ 2 PROJESİ (ŞİRKET İÇİ VERİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GİZLİLİK, BÜTÜNLÜK VE ERIŞEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI)	YT210015	Metro İstanbul ISO 27001 Bilgi Güvenliği	100%		1.10.2021	1.12.2022	100%	1.068.000,00TRY		428.691,89TRY		40%
MOBİL CİHAZ YÖNETİM UYGULAMASININ İMPLENTASYONU		MDM Uygulaması İmplementasyonu	100%	TAMAMLANDI	4.07.2022	29.07.2022	100%	0,00TRY		61,20TRY		0%
BAKIM MOBİL UYGULAMASI		Mobil bakım uygulama işi	100%	TAMAMLANDI	1.06.2022	30.06.2022	100%	0,00TRY		2.618,87TRY		0%
ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİNİN İMPLENTASYONU		Envanter Yönetim Sisteminin İmplementasyonu	100%	TAMAMLANDI	1.01.2022	30.08.2022	100%	0,00TRY		7.016,67TRY		0%
ORTAK ALAN PAYLAŞIM SİSTEMİNİN KURULMASI		Ortak Alan Paylaşım Sisteminin Kurulması	100%	TAMAMLANDI	4.07.2022	29.07.2022	100%	0,00TRY		1.173,82TRY		0%
SAP EĞİTİM PLANLAMA VE YÖNETİM MODÜLÜNÜN DEVREYE ALINMASI		SAP Eğitim Planlama ve Yönetim Modülü	100%	TAMAMLANDI	1.01.2022	30.08.2022	100%	150.000,00TRY		0,00		0%
BIG DATA PROJESİ (SCADA SİSTEMİ, ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ, YOLCU GEÇİŞ SİSTEMİ VB. KAYNAKLARDAN GELEN VERİYİ TEK BİR PLATFORMDA TOPLAMAK (BIG DATA), ANALİZ ETMEK VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE YARDIMCI OLACAK RAPORLAR ÜRETMEK)	GD180012	ESM Big Data Veri Analizi Projesi	98%	DEVAM EDİYOR	9.02.2018	30.12.2022	99%	250.000,00TRY		6.189,43TRY		2%
SAP UPGRADE PROJESİ	YT220002	SAP Upgrade Projesi	65%	DEVAM EDİYOR	1.06.2022	30.01.2023	80%	1.800.000,00TRY		179.814,36TRY		10%
HUKUK SÜREÇLERİNİN DIGITALİZE EDİLİP SAP ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI		Hukuk Süreçlerinin Dijitalize Edilmesi	20%	DEVAM EDİYOR	1.06.2022	1.01.2023	91%	0,00TRY		7.085,12TRY		0%
GÜVENLİK CİHAZLARI DISASTER SİSTEMİNİN SAĞLANMASI		Güvenlik Ürünleri Disaster Sistem Kurulu	20%	DEVAM EDİYOR	16.09.2022	29.12.2023	19%	70.000,00USD		55.805,73TRY		4%


2022 Yılı BSM Emreamadelik

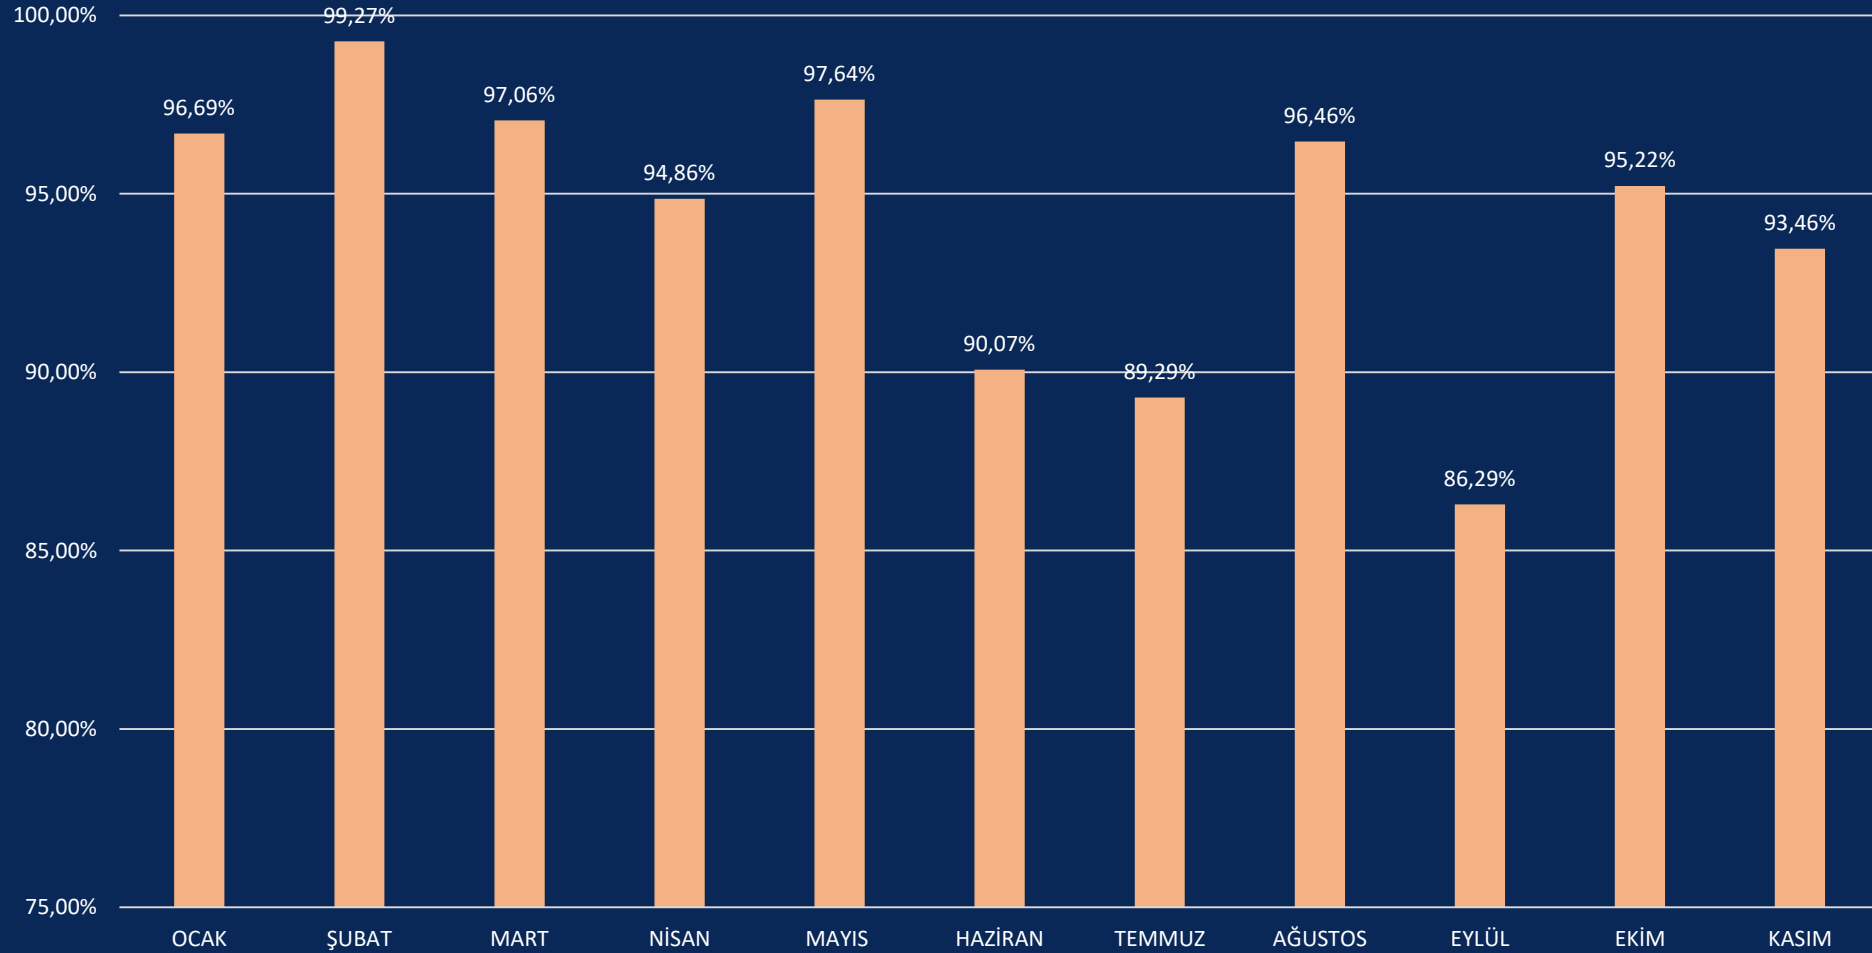


Kasım Ayı Şeflik Bazlı Emreamadelik

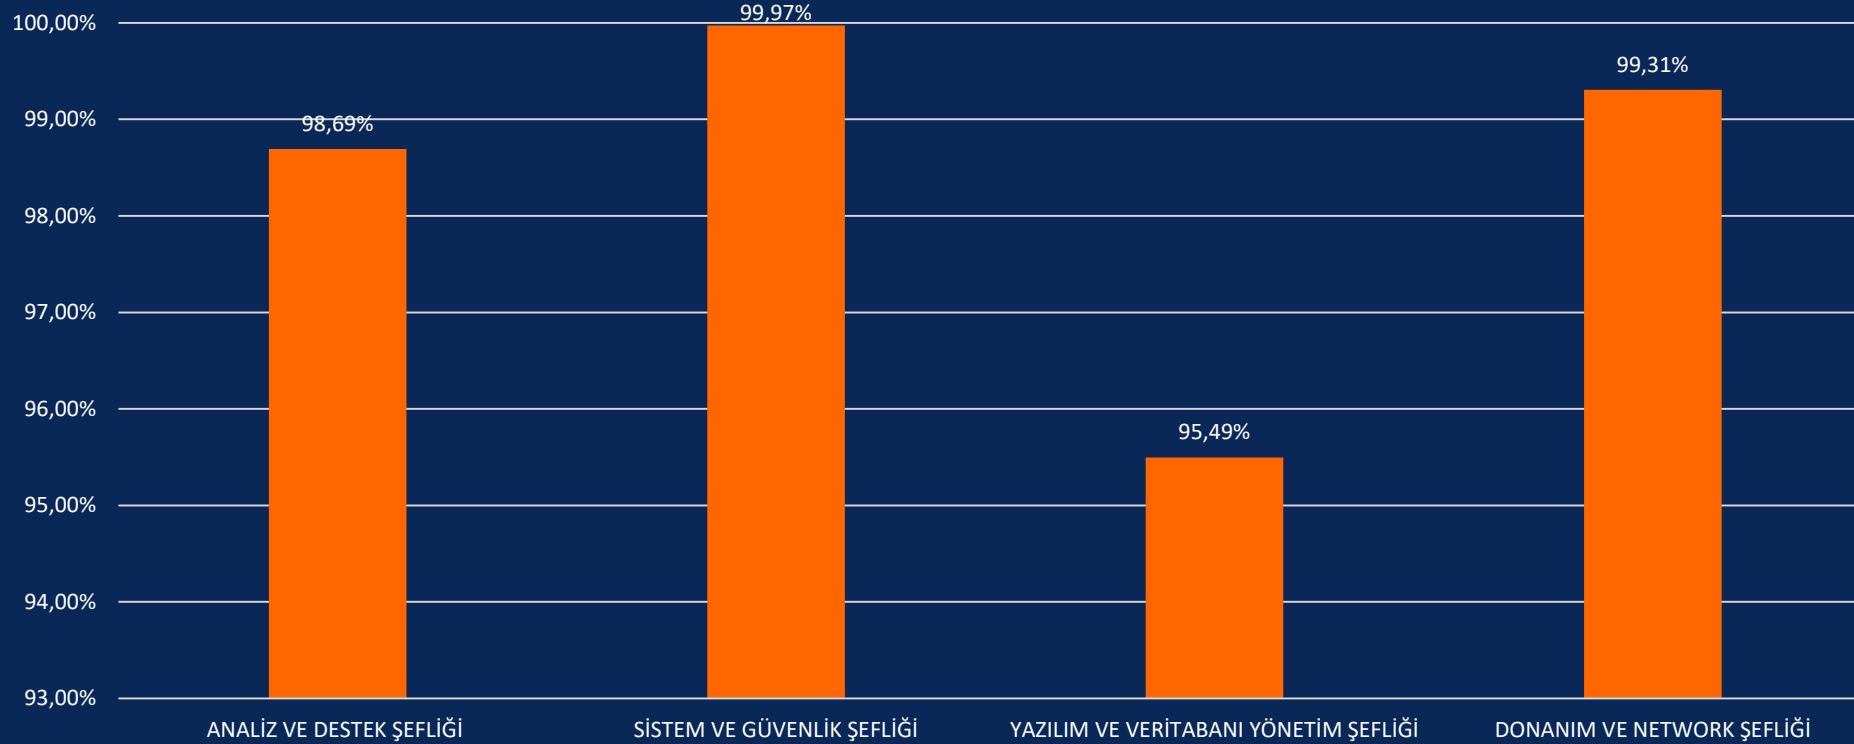

YDM Bildirim Cevaplama Sayısı

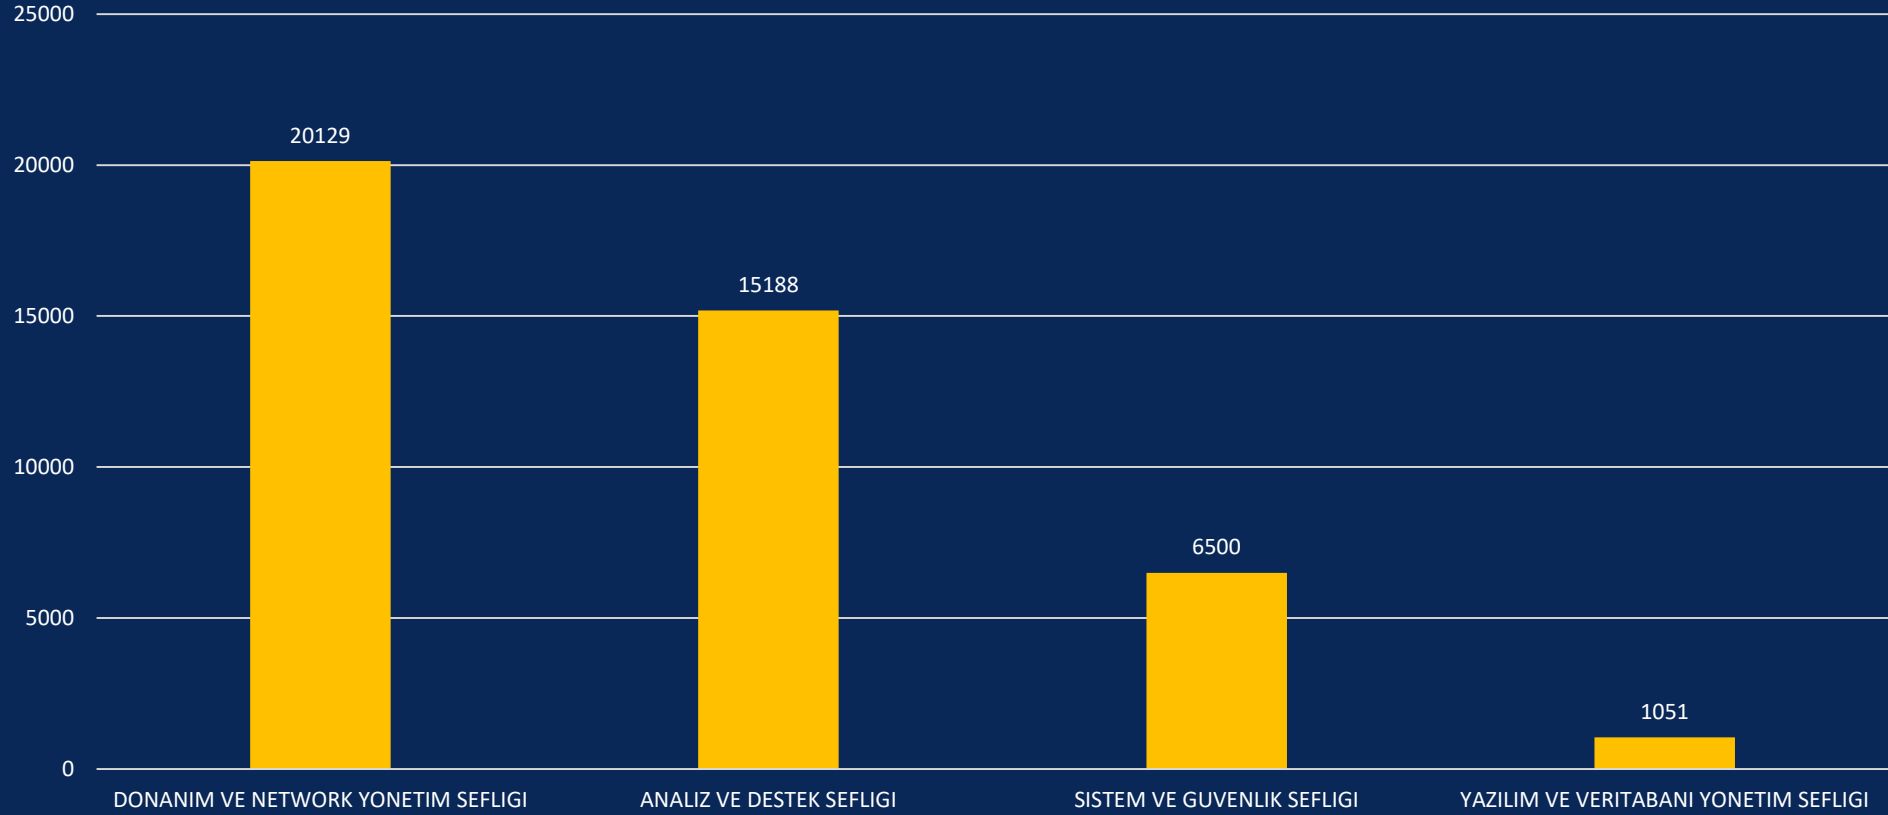

YDM Bildirim Cevaplama Oranı

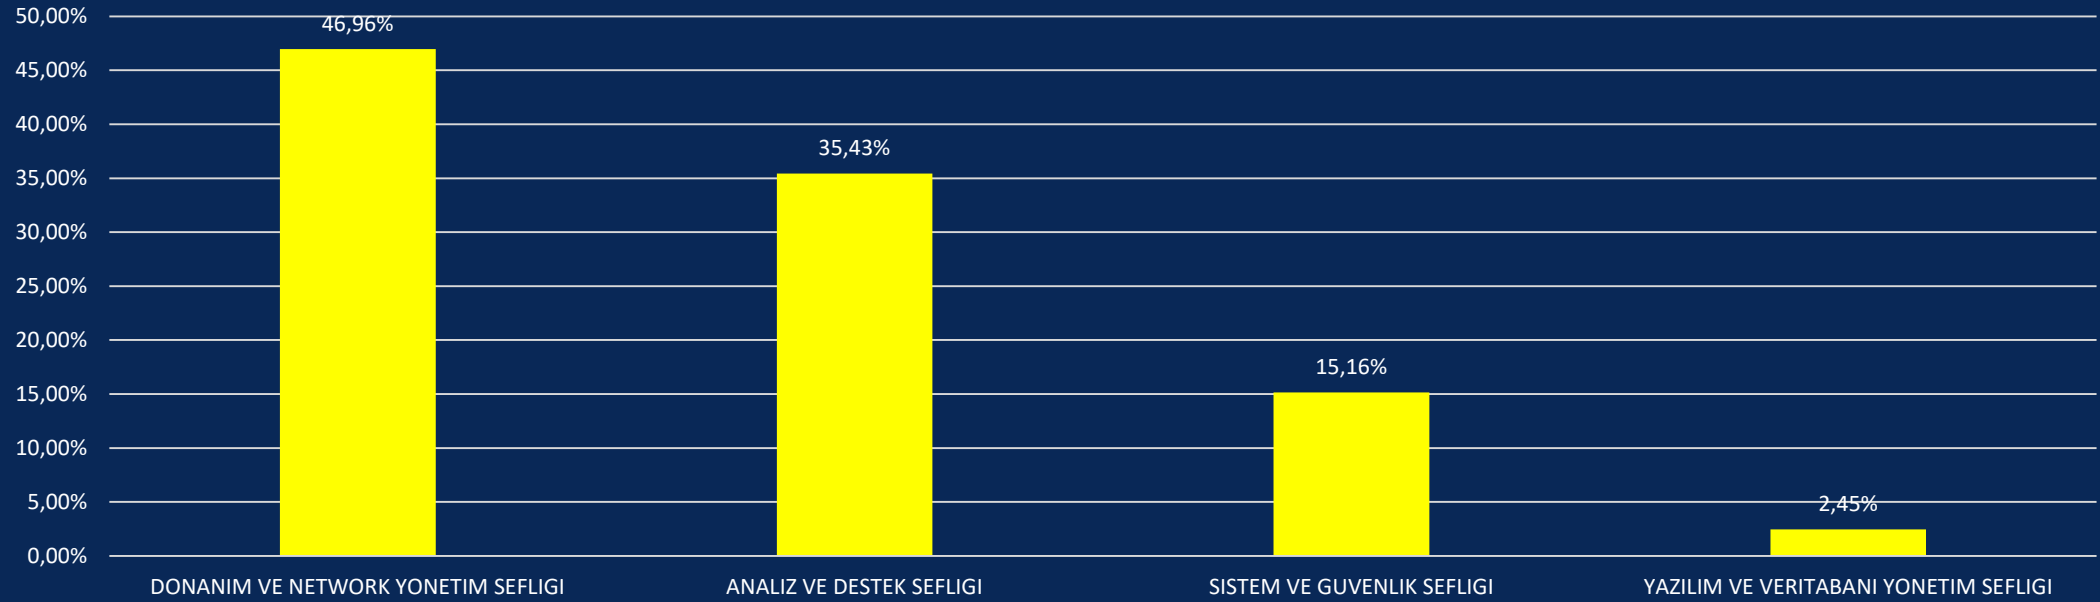

SAP Upgrade

Ağırlık	Nesne türü	Nesne kodu	Düzyey	Tanım	En erken bşl.tarihi	En geç bitiş tarihi	Fiili tutar	Kazanılmış değer	Plan ilerleme (%)	Fiili ilerleme (%)
100,00	PYP	YT220002.00	1	SAP Upgrade Projesi	10.06.2022	30.01.2023	179.814,36	0,00	89,67	65,00
15,00	PYP	YT220002.001	2	OS KURULUMU	1.09.2022	8.09.2022	3.568,99	0,00	100,00	100,00
20,00	PYP	YT220002.002	2	HANA KURULUMU	10.06.2022	8.09.2022	0,00	0,00	100,00	100,00
15,00	PYP	YT220002.003	2	VERİ TABANI KOPYALAMA	1.07.2022	8.09.2022	0,00	0,00	100,00	100,00
9,00	PYP	YT220002.004	2	TEST DOKÜMANLARININ OLUŞTURULMASI	22.08.2022	30.07.2022	13.355,70	0,00	0,00	100,00
30,00	PYP	YT220002.005	2	BİRİM, ENTEGRASYON TESTLERİ VE EĞİTİM	1.08.2022	15.11.2022	152.739,31	0,00	100,00	20,00
10,00	PYP	YT220002.006	2	CANLI GEÇİŞ	15.11.2022	14.12.2022	6.716,99	0,00	96,67	0,00
1,00	PYP	YT220002.007	2	YENİ FİORİ UYGULAMALARININ UYARLANMASI	15.12.2022	30.01.2023	3.433,37	0,00	0,00	0,00
